


COMUNE DI NERVIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



SERVIZI TECNICI 3 UFFICIO PROGETTAZIONE

AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA DI VITTORIO **PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA: MAGGIO 2017


I TECNICI COMUNALI - PROGETTISTI

GEOM. SALVATORE LA RUFFA

La Ruffa

IL RESPONSABILE P.O. Area Tecnica
SERVIZI TECNICI 3

Ambr. C...

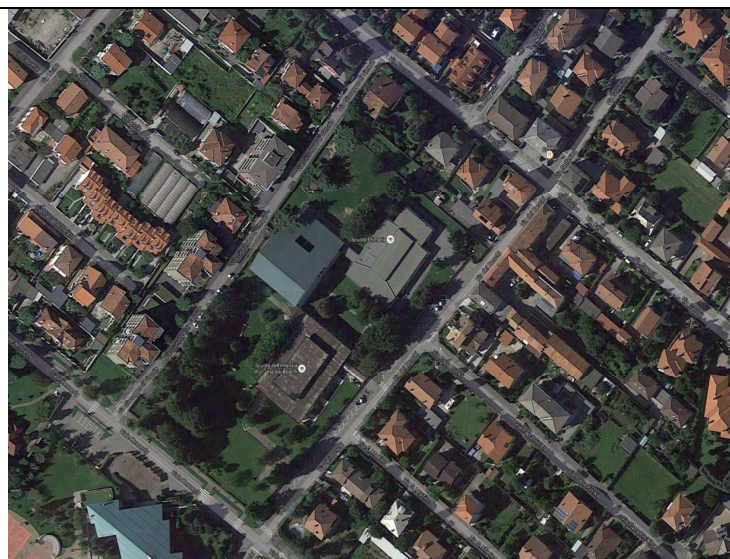

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori è di 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna (articolo 36 capitolato speciale di appalto).

Nel caso di consegna frazionata i giorni naturali e continuativi decorreranno dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel tempo utile per la consegna dei lavori è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, quello per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e quello per ogni altro lavoro preparatorio da eseguirsi prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Le principali lavorazioni previste, divise per macro interventi, sono le seguenti le stesse sono meglio evidenziate nel diagramma di gant allegato:

1) realizzazione di nuova recinzione	giorni	30
2) demolizione recinzione esistente	giorni	5
3) sistemazioni aree interne asfaltate	giorni	15
4) pensiline	giorni	20
5) recinzioni interne con cancelli	giorni	20
6) sistemazioni strada via Di Vittorio	giorni	35
7) segnaletica e arredo urbano	giorni	5

Totale dei giorni previsti e risultanti dall'elenco sopra citato 130 naturali e consecutivi.

Considerato che i lavori possono essere eseguiti contemporaneamente in più strade-cantieri e data la particolarità dell'intervento diversificato per tipologia di lavoro opere stradali, (asfaltature, posa cordoli) opere in C.A., (recinzioni e pensiline), sistemazioni interne, si ritiene congruo in 120 giorni il tempo assegnato per la realizzazione delle opere in progetto fattibile con l'impiego di più squadre operative.

La suddivisione effettiva compresa la sovrapposizione delle tempistiche relative alle singole lavorazioni, sarà definita in sede di presentazione del piano operativo di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria.

Nel calcolo prestabilito del tempo sopra evidenziato contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole in base alle caratteristiche climatiche della zona.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per cause imputabili all'impresa, lo svolgimento dei lavori deve rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma redatto congiuntamente dall'impresa e dall'incaricato della stazione appaltante.

Non potendo a priori conoscere le caratteristiche tecniche e organizzative della ditta appaltatrice, si procederà con la stessa, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione un programma dettagliato sulle tempistiche di intervento.

La ditta, inoltre, dovrà prima della consegna dei lavori presentare un proprio piano operativo rispettando tutte le norme in materia di sicurezza concordato con il responsabile della sicurezza e il responsabile del procedimento

Rimane inteso che devono essere rispettati i tempi contrattuali preventivati in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

